

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ



FACULTAD DE INGENIERÍA



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA



INFORME 1 EV3 RESCUE LINE

Alumnos: Martin González
Hilda Albarracin
Isaac Contreras
Pedro Archile
Guillermo Pino

Asignatura: Proyecto 1

Profesor: Humberto Urrutia

SEPTIEMBRE - 2024

ÍNDICE

1. Plan general	3
1.1. Introducción.....	3
1.2. Objetivos.....	3
1.2.1. Objetivo general.....	3
1.2.2. Objetivos específicos.....	3
1.3. Restricciones.....	3
1.4. Entregable.....	4
2. Organización del personal	5
2.1. Descripción de los roles.....	5
2.2. Personal que cumplirá los roles.....	5
2.3. Métodos de comunicación.....	5
3. Planificación del proyecto	6
3.1. Actividades (Carta Gantt).....	6
3.2. Asignaciones de tiempo.....	7
3.3. Gestión de Riesgo.....	7
4. Planificación de los recursos	8
4.1. Hardware.....	8
4.2. Software.....	8
5. Conclusión	10
6. Referencias	11

1. Plan general

1.1. Introducción

En este semestre de clases, nos embarcaremos en un emocionante proyecto de ingeniería que involucra el desarrollo de un robot utilizando el kit LEGO MINDSTORMS EV3. Este proyecto se llevará a cabo de manera progresiva, con actividades y tareas asignadas semanalmente. A lo largo del semestre, cada integrante del equipo asumirá la responsabilidad de un aspecto específico del proyecto, lo que contribuirá a un mejor y más ordenado desarrollo del mismo. Los roles son: documentador, ensamblador, diseñador, programados y jefe de grupo.

El presente informe detalla los roles asignados a cada miembro del equipo, así como los costos asociados con el desarrollo del robot. Este enfoque no solo nos permitirá aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase, sino también desarrollar habilidades prácticas en áreas clave como la programación, la ingeniería y el trabajo en equipo.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Idear, construir y programar un robot del tipo EV3. Este debe poseer la capacidad de moverse a gusto del usuario y utilizar una garra que pueda sujetar una pelota de ping pong.

1.2.2. Objetivos específicos

- Realizar una planificación de un proyecto.
- Idear y construir un robot funcional a partir del kit LEGO MINDSTORMS EV3.
- Cargar una tarjeta microSD con el sistema operativo necesario para que el robot EV3 sea capaz de correr programas de software programados en Python.
- Confeccionar una aplicación de software que permita el movimiento y transmisión de ordenes al robot EV3 de manera remota.
- Ajustar y optimizar la aplicación anteriormente descrita para que cumpla su propósito lo más eficientemente posible.

1.3. Restricciones

- El robot debe estar armado a base del set LEGO MINDSTORMS EV3 de Lego.
- El lenguaje de programación que se exige para este proyecto es Python.
- El sistema operativo que se debe utilizar a lo largo del proyecto es Linux.

- Este proyecto también posee limitaciones de tiempo que deben ajustarse al formato de un semestre universitario.
- Toda la documentación debe ser publicada en la plataforma Redmine perteneciente a la Universidad de Tarapacá.

1.4. Entregable

En medida que avanzamos en la asignatura se debe entregar al profesor una serie de documentos que registren nuestro progreso del proyecto los cuales son:

1. **Bitácoras:** Documento de tipo informe que registra el progreso del proyecto, se requiere redactar uno por semana y debe ser entregado cada domingo a más tardar.
2. **Carta Gantt:** una línea de tiempo en un periodo determinado que contiene una representación gráfica de las tareas a ejecutar y su duración a lo largo del progreso del proyecto.
3. **Informes:** Dentro del plazo que se tiene para desarrollar el proyecto se deben redactar dos informes. El presente conteniendo la formulación del proyecto y el progreso hasta el momento de la entrega. Mientras que el segundo se trata del informe final del proyecto.
4. **Presentaciones:** Cada vez que se entregue un informe, este debe venir acompañado de una presentación relacionada con el contenido del informe en cuestión.
5. **Manual de usuario:** Se debe confeccionar un manual de instrucciones que detallen las funcionalidades del robot construido y una guía de cómo se operan sus funcionalidades.

2. Organización del personal

2.1. Descripción de los roles

1. **Jefe de grupo:** Encargado de la representación del grupo de trabajo ante terceros, además será responsable de la buena organización del mismo.
2. **Diseñador:** Se encargará de todo el apartado de "diseño" referente al proyecto. Ya sea presentaciones, interfaz de usuario, la wiki, etc.
3. **Documentador:** Será el responsable de la, valga la redundancia, documentación del proyecto: toma de fotos y videos del progreso del proyecto, bitácoras semanales, informes, carta Gantt, etc.
4. **Programador:** Encargado de idear e implementar algoritmos computacionales que cumplan con los requerimientos de movimiento del robot y sus funcionalidades.
5. **Ensamblador:** Se compromete con la arquitectura y el armado del robot, lo que engloba una base móvil y una garra que sea capaz de sostener una pelota de ping pong.

2.2. Personal que cumplirá los roles



Rol	Responsable	Implicados
Jefe de grupo	Isaac Contreras	Hilda Albarracin
Diseñador	Hilda Albarracin	Guillermo Pino Pedro Archile
Programador	Martín González	Isaac Contreras
Ensamblador	Pedro Archile	Hilda Albarracin Isaac Contreras
Documentador	Guillermo Pino	Martín González Isaac Contreras

2.3. Métodos de comunicación

A lo largo del desarrollo del proyecto, se utilizarán principalmente dos medios de comunicación entre los integrantes del grupo. Dichos medios son WhatsApp y Discord ambos medios fiables y gratuitos para el uso público, además de muy convenientes y que en ambos es posible crear una vía de comunicación tanto verbal como escrita, accesible y de fácil entendimiento.

3. Planificación del proyecto

3.1. Actividades (Carta Gantt)

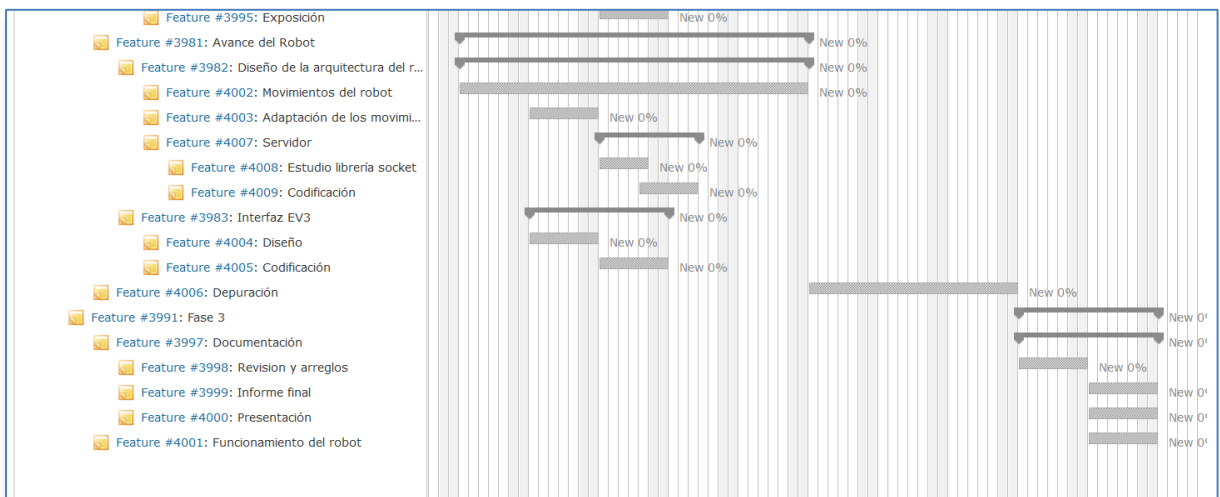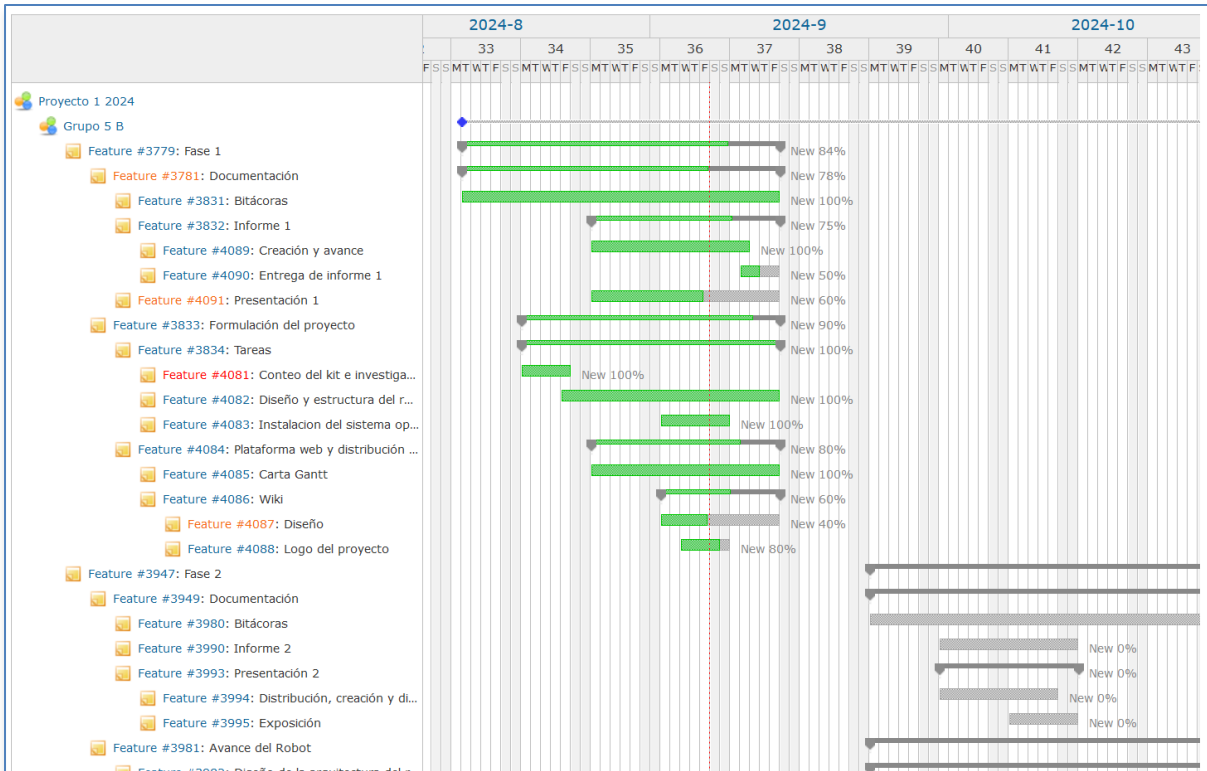

3.2. Asignaciones de tiempo

- Planificación del proyecto: semana 4 semanas.
- Ejecución del proyecto: 6 semanas.
- Toques finales: 3 semanas.
- Tiempo total de proyecto: 13 semanas.

3.3. Gestión de Riesgo

Niveles de impacto:

1. **Catastrófico (1):** Daño que debe ser reparado inmediatamente, pues pondrá al proyecto en pausa de manera indefinida.
2. **Crítico (2):** En caso de ocurrencia, debe ser resuelto a la brevedad, debido a que tener uno de estos problemas retrasará el proyecto en varias etapas.
3. **Circunstancial (3):** Problema que es necesario resolver en el momento, de lo contrario podría retrasar el proyecto en una etapa en específico.
4. **Irrelevante (4):** El daño causado por este tipo de riesgo es mínimo por lo tanto es un problema menor que puede ser resuelto en cualquier momento.

Tipo de Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Nivel de Impacto	Acciones Por Tomar
Error en la codificación	90%	2	Revisar y analizar el código escrito para identificar el problema encontrado y resolverlo.
Desarme del robot por contusión o caída	10%	2	Se le informa a los implicados en la arquitectura del robot y se efectúa un rearmado del mismo.
Carencia de una pieza específica requerida	30%	4	Se consulta al personal a cargo de las piezas.
Falta de un miembro por enfermedad o problemas personales	90%	3	Se reorganizan las tareas que el miembro faltante debía cumplir entre los miembros restantes.

Incompatibilidad de la arquitectura del robot con los objetivos que debe cumplir	60%	2	Rediseñar y armar un nuevo robot que sea capaz de cumplir con los requerimientos.
Perdida parcial o total de archivos	20%	2	Recrear lo más exacto posible todo el material perdido.

4. Planificación de los recursos

4.1. Hardware

Todos los recursos físicos que se utilizarán para llevar a cabo el proyecto serán los siguientes:

- Kit LEGO MINDSTORMS EV3.
- Tarjeta microSD con su correspondiente adaptador para PC.
- Adaptador Wi-Fi USB.
- Notebook con sistema operativo Linux que permita codificar en el robot.
- Galaxy Tab S8.

4.2. Software

- Linux como sistema operativo.
- Discord y WhatsApp como medios de comunicación.
- Visual Studio Code como editor de código y conexión al robot EV3.
- Canva para crear las presentaciones.

4.3. Estimación de costos

Categoría	Descripción	Cantidad	Costo (CLP)
Hardware	Kit básico LEGO MINDSTORMS EV3	1	\$ 1.006.350
	MicroSD c/ Adaptador	1	\$ 13.000
	Adaptador wifi	1	\$ 9.450
	Notebook	3	\$ 1.920.000
	Samsung Galaxy Tab S8	1	\$ 520.000
Software	Licencia Canva Pro Equipo / 4 meses	1	\$ 120.000
	Plan Discord Nitro / 5 personas / 4 meses	1	\$ 107.200

La cantidad de horas trabajadas y horas extra se considerarán utilizando la planificación de la asignatura Proyecto I. Horas trabajadas siendo horas presenciales (72) y horas extra siendo horas autónomas (82).

Cargo	Valor hora (CLP)	Horas presenciales	Horas autónomas	Total horas	Sueldo mensual (CLP)
Jefe de grupo	\$ 9.231	72	82	154	\$ 1.421.574
Programador	\$ 6.701	72	82	154	\$ 1.031.954
Ensamblador	\$ 7.385	72	82	154	\$ 1.137.290
Diseñador	\$ 3.692	72	82	154	\$ 568.568
Documentador	\$ 8.615	72	82	154	\$ 1.326.710
Total					\$ 5.486.096

5. Conclusión

Durante el avance del proyecto, observamos puntos clave que han influido en nuestro progreso, como la planificación, la distribución del tiempo que han sido fundamentales para mantener el desarrollo del proyecto, la carta Gantt para organizar nuestras tareas y asegurarnos de que cada fase del proyecto se complete dentro del plazo establecido, y el tiempo en clases, que hemos aprovechado para discutir ideas y resolver problemas. Para completar con éxito nuestro proyecto seguiremos trabajando con la misma dedicación y coordinación como también con un enfoque positivo durante el semestre.

6. Referencias

LEGO El juego de construcción MINDSTORMS EV3 incluye 3. (s. f.). Amazon.
[https://www.amazon.com/-/es/construcci%C3%B3n-MINDSTORMS-servomotores-](https://www.amazon.com/-/es/construcci%C3%B3n-MINDSTORMS-servomotores-interactivos-)

[redise%C3%B1ado/dp/B016SF8GWY/ref=sr_1_4?_mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=2WBMO7SQXAJLG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.p7tS_F0gBAKeTwGBJCbB4UkO5GleFi-vz-uPW2z2UBkvmKRBB-Q59De-WcnqoP_CgLOCrW_2nTzP2TxFPBbhKj8WVFO9KM3FrVUYtGI9iHDjYKTJASwBN_EmqelSeXupG3xGPhMTseQt3A31XMeihvq7vOoNNCv5G3MMVDbCxPg39fIGqrZ15z-hgyg7i6ND-MBOHhOUUnu_6xFrkZ1iXq08UTiN_6n8n4HcP6xgnL-2JuCqkg1bRuQwGEymJsYbRa9pHnHYzmcnQ1rH9SIX6dberxnizuYKM_nKzpmQ2XKM.ZmM0iz9cRtDIE_tIT9uCN3PR62ls5rI5-juebMjVK8Q&dib_tag=se&keywords=ev3%2Blego%2Brobotics%2Bkit&qid=1725937954&sprefix=ev3%2Blego%2Brobotics%2Bkit%2Caps%2C415&sr=8-4](https://www.amazon.com/-/es/construcci%C3%B3n-MINDSTORMS-servomotores-interactivos-redise%C3%B1ado/dp/B016SF8GWY/ref=sr_1_4?_mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=2WBMO7SQXAJLG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.p7tS_F0gBAKeTwGBJCbB4UkO5GleFi-vz-uPW2z2UBkvmKRBB-Q59De-WcnqoP_CgLOCrW_2nTzP2TxFPBbhKj8WVFO9KM3FrVUYtGI9iHDjYKTJASwBN_EmqelSeXupG3xGPhMTseQt3A31XMeihvq7vOoNNCv5G3MMVDbCxPg39fIGqrZ15z-hgyg7i6ND-MBOHhOUUnu_6xFrkZ1iXq08UTiN_6n8n4HcP6xgnL-2JuCqkg1bRuQwGEymJsYbRa9pHnHYzmcnQ1rH9SIX6dberxnizuYKM_nKzpmQ2XKM.ZmM0iz9cRtDIE_tIT9uCN3PR62ls5rI5-juebMjVK8Q&dib_tag=se&keywords=ev3%2Blego%2Brobotics%2Bkit&qid=1725937954&sprefix=ev3%2Blego%2Brobotics%2Bkit%2Caps%2C415&sr=8-4)

Memoria Micro Sd Hc 8gb Sandisk Clase 4. (s. f.). MercadoLibre.
[https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1889109532-memoria-micro-sd-hc-8gb-sandisk-clase-](https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1889109532-memoria-micro-sd-hc-8gb-sandisk-clase-4-)

[4-
_JM#position%3D4%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3D081e5023-6eda-4abe-b26d-9f6e10d7e644](https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1889109532-memoria-micro-sd-hc-8gb-sandisk-clase-4-_JM#position%3D4%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3D081e5023-6eda-4abe-b26d-9f6e10d7e644)

Adaptador de Wifi Nano Inalambrico 150 mbps. (s. f.). MercadoLibre.
[https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-511410157-adaptador-wifi-usb-nano-inalambrico-](https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-511410157-adaptador-wifi-usb-nano-inalambrico-150mbps-wn725n-tp-link-)

[150mbps-wn725n-tp-link-
_JM#position%3D22%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3Dda65db98-0232-4dd5-a29c-2bb94ca8bd95](https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-511410157-adaptador-wifi-usb-nano-inalambrico-150mbps-wn725n-tp-link-_JM#position%3D22%26search_layout%3Dstack%26type%3Ditem%26tracking_id%3Dda65db98-0232-4dd5-a29c-2bb94ca8bd95)

Sueldo Graphic Designer en Santiago, Chile 2024. (2024). Glassdoor.
[https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/santiago-graphic-designer-sueldo-](https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/santiago-graphic-designer-sueldo-SRCH_IL.0,8_IM1004_KO9,25.htm)

[SRCH_IL.0,8_IM1004_KO9,25.htm](https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/santiago-graphic-designer-sueldo-SRCH_IL.0,8_IM1004_KO9,25.htm)

Salario para Ingeniero Eléctrico en Chile. (2024). Talent.
<https://cl.talent.com/salary?job=ingeniero+electrico#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20gana%20un%20Ingeniero%20electrico%20en%20Chile%3F&text=El%20salario%20ingeniero%20electrico%20promedio,con%20un%20ingreso%20de%20%2410.800.>

Sueldos de ingenieros software. (2024, septiembre) Chiletrabajos.
<https://www.chiletrabajos.cl/sueldos/ingeniero/software#:~:text=Salario%20o%20sueldo%20promedio%20de,840%20en%20Septiembre%202024>

Salario para Jefe De Proyecto en Chile- Salario Medio. (2024). Talent.
<https://cl.talent.com/salary?job=jefe+de+proyecto#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20gana%20un%20Jefe%20de%20proyecto%20en%20Chile%3F&text=El%20salario%20jefe%20de%20proyecto,a%C3%B1o%20o%20%249.231%20por%20hora.>

Salario para Administrador de Proyecto en Chile. (2024). Talent.

<https://cl.talent.com/salary?job=administrador+de+proyecto#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20gana%20un%20Administrador%20de%20proyecto%20en%20Chile%3F&text=El%20salario%20administrador%20de%20proyecto%20promedio%20en%20Chile%20es%20de%20%2416.800.>

Documents - Grupo 5 B – Redmine. (2024. 12 septiembre). Redmine.

<http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-5-b/documents>
